

BOLETIM DE MEDIÇÃO

003



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 07/02/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 48.667,30

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DE ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PAULO VIANA DE QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE FERREIROS

CONTRATO R\$: 141.049,87

CONTRATO: 085/SMOF/2021 MODALIDADE: TP N°007/2021 PRAZOS DE EXEC.: 29/11/2021 28/04/2022

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS: 29/11/2021 PRAZO (DIAS): 150 ADITIVO (DIAS):

C. ADITADO R\$: 141.049,87

EMPRESA CONTRATADA: PROPRIETÁRIO: CRISTIANO NEDEIRINO DE SOUSA

DATA FINAL: 28/04/2022

CNPJ: CPF:

P. RESTANTE DIAS: 80

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA:

SALDO R\$: 55.800,26

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 03/01/2022 À 07/02/2022

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 608-4

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA

CREA/RPN: 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20220724641

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA MEDIDA PERÍODO ANTERIOR
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.049,04	0,00	1.049,04	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	174,84	6,00	0,00	6,00	1.049,04	0,00	1.049,04	100,00%
2.0	DEMOLIÇÃO/RETIRADAS/REMOÇÕES						2.744,05	0,00	2.744,05	
2.1	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	m²	31,09	62,48	0,00	62,48	1.942,50	0,00	1.942,50	100,00%
2.2	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	13,79	25,82	0,00	25,82	356,05	0,00	356,05	100,00%
2.3	REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO	m²	35,64	12,50	0,00	12,50	445,50	0,00	445,50	100,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA						2.421,44	0,00	2.421,44	
3.1	ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m	m³	54,80	37,68	0,00	37,68	2.064,86	0,00	2.064,86	100,00%
3.2	ATERRO/REATERRO COM TRANSPORTE ATE 1km MATERIAL GERAL	m³	8,70	14,80	0,00	14,80	128,76	0,00	128,76	100,00%
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	46,40	4,91	0,00	4,91	227,82	0,00	227,82	100,00%
4.0	PISOS INTERNOS E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS						8.906,54	7.243,48	8.167,55	
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	86,51	83,76	83,73	83,73	7.246,07	7.243,48	7.243,48	99,96%

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.02.07 17:50:59 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	TEMPO NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	RECORRIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
4.2	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	und	24,14	38,28	0,00	38,28	924,07	0,00	924,07	100,00%
4.3	RAMPA DE PLANO INCLINADO L=1,00m COM BASE CONCRETO ESPES. 15cm	m	203,99	3,61	0,00	0,00	736,40	0,00	0,00	0,00%
							10.246,03	0,00	9.652,74	
5.0	REVESTIMENTO									
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	m²	125,60	61,93	0,00	61,93	7.778,40	0,00	7.778,39	100,00%
5.2	PASTILHA 5 x 5cm DE PORCELANA PA0010082 DR 601 BEGE AVARE NGK	m²	79,88	5,23	0,00	5,23	417,77	0,00	417,77	100,00%
5.3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro	m²	3,51	61,93	0,00	61,93	217,37	0,00	217,37	100,00%
5.4	EMBOCO ESPESSURA 2,5cm- CIMENTO/AREIA/CAL 1:1:8	m²	20,01	61,93	0,00	61,93	1.239,21	0,00	1.239,21	100,00%
5.5	REBOCO PRONTO PREFABRICADO 2,5mm PAREDES C/EMBOCO DESEMPENADO	m²	9,58	61,93	0,00	0,00	593,28	0,00	0,00	0,00%
							7.679,96	7.679,96	7.679,96	
6.0	HIDROSANITARIO									
6.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	und	329,99	4,00	4,00	4,00	1.319,96	1.319,96	1.319,96	100,00%
6.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	m	106,00	60,00	60,00	60,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	100,00%
							25.152,09	0,00	6.689,68	
7.0	PINTURA									
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	m²	16,56	1.114,88	0,00	0,00	18.462,41	0,00	0,00	0,00%
7.2	ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO EM FACHADAS	m²	11,39	587,33	0,00	587,33	6.689,68	0,00	6.689,68	100,00%
							82.850,72	33.743,66	46.845,15	
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	81,65	89,07	0,00	89,07	7.272,56	0,00	7.272,56	100,00%

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital
por ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Dados: 2022.02.07 17:51:08
-03'00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO
8.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	m²	254,20	258,36	126,50	126,50	65.675,11	32.156,30	32.156,30	48,96%
8.3	CONCRETO fck=25MPa APLICADO EM PILARES DE ESTRUTURAS	m³	955,49	0,44	0,00	0,44	420,41	0,00	420,41	100,00%
8.4	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COMPLETO	m²	325,92	7,63	0,00	0,00	2.486,76	0,00	0,00	0,00%
8.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	503,99	3,15	3,15	3,15	1.587,56	1.587,56	1.587,56	100,00%
8.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	25,90	178,14	0,00	178,14	4.613,82	0,00	4.613,82	100,00%
8.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	4,46	178,14	0,00	178,14	794,50	0,00	794,50	100,00%
TOTAL							141.049,87		85.249,61	60,44%

OBRIGATORIO O CARIMBO.

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.02.07 17:51:18 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Atesto que os Serviços / Produtos
Foram Efetivamente Prestados / Entregues

07/02/2022
Marta Vieira

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 003

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DE ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PAULO VIANA DE QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE FERREIROS

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	
4.0	PISOS INTERNOS E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS						
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m ²	86,51	83,76	83,73	(3,90 x 6,70) + (6,00 x 4,90) + (7,05 x 4,00)	
6.0	HIDROSANITARIO						
6.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	und	329,99	4,00	4,00	4,00	Serviço concluído
6.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	m	106,00	60,00	60,00	60,00	Serviço concluído
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
8.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MJURETA). AF 03/2021	m ²	254,20	258,36	126,50	46,00 x 5,50 x 50,00%	Serviço em execução, considerado 50% do serviço devido apenas instalados a estrutura de fixação do alambrado
8.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m ²	503,99	3,15	3,15	1,50 x 2,10	Serviço concluído

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.02.07 17:51:28 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO


C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Atesto que os Serviços / Produtos
Foram Efetivamente Prestados / Entregues

07/10/2022
Ítalo Henrique Cavalcante de Almeida

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DE ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PAULO VIANA DE QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE FERREIROS

VISÃO GERAL DA OBRA

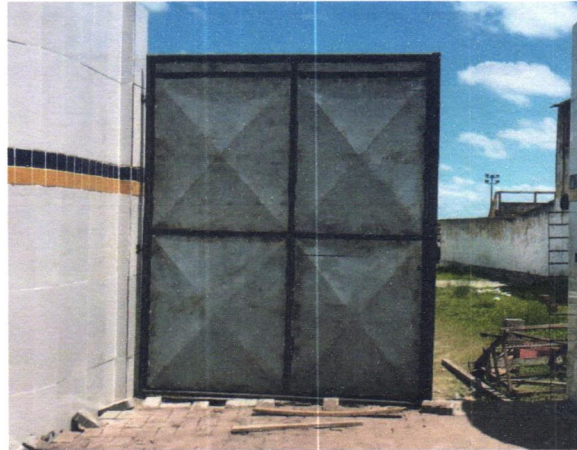

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.02.07 17:51:38 -03'00'

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
