

BOLETIM DE MEDIÇÃO

003



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 11/07/2024

VALOR DA MEDIÇÃO: 44.028,04

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ

CONTRATO RS: 188.240,91

CONTRATO: 008/2024 MODALIDADE: TP 005/2023 PRAZOS DE EXEC.: 21/02/2024 21/05/2024

ADITIVOS RS: 35.681,31

ORDEM DE SERVIÇOS: 21/02/2024 PRAZO (DIAS): 90 ADITIVO (DIAS): 90 -

C. ADITADO RS: 223.922,22

EMPRESA CONTRATADA: GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP PROPRIETÁRIO: JOÃO BATISTA DA SILVA

DATA FINAL: 19/08/2024

CNPJ: 22.594.155/0001-36 CPF: 921.949.824-34

P. RESTANTE DIAS: 39

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA CREA: 180.429.378-4 PE20241099726

SALDO RS: 22.668,58

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 22/05/2024 À 11/07/2024

GESTOR DE CONTRATO: CESAR MARCELINO DA SILVA MATRÍCULA: 0543
 FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA CREA/RPN: 160.666.136-1
 ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA CREA/RPN: 160.991.108-3_PE20241111502
 CNO: 90.018.38309/73

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						12.639,00	5.790,23	11.359,35	
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,90	54,00	23,66	48,53	7.176,60	3.144,79	6.449,85	89,87%
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,52	120,00	58,12	107,85	5.462,40	2.645,44	4.909,50	89,88%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						18.372,29	825,32	18.372,29	
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	365,86	2,25	0,00	2,25	823,18	0,00	823,18	100,00%
2.2	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	10,70	217,00	0,00	217,00	2.321,90	0,00	2.321,90	100,00%
2.3	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	12,37	302,00	0,00	302,00	3.735,74	0,00	3.735,74	100,00%
2.4	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	49,61	215,00	0,00	215,00	10.666,15	0,00	10.666,15	100,00%
2.5	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	3,76	219,50	219,50	219,50	825,32	825,32	825,32	100,00%
3	MURO DE CONTENÇÃO						84.632,27	1.930,03	78.267,04	
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	98,53	23,13	2,50	23,13	2.278,99	246,33	2.278,99	100,00%

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
9

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.07.11 11:02:38 -03'00'

JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434
Dados: 2024.07.11 11:02:38 -03'00'

RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151459

Assinado de forma digital por RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151459
Dados: 2024.07.11 11:02:38 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
4.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	761,71	2,00	2,00	2,00	1.523,42	1.523,42	1.523,42	100,00%
4.11	Banco de concreto pre-moldado com encosto	UN	1.052,17	2,00	2,00	2,00	2.104,34	2.104,34	2.104,34	100,00%
TOTAL							223.922,22	44.028,04	201.253,64	89,88%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.07.11 11:02:58 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434

RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:02042151459

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 003

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDO NO PERÍODO				OBSERVAÇÕES
					COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	TOTAL	
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m²	31,11	177,20	34,00	0,40	1,20	16,32	Serviço em execução
								Total Item 4.2	16,32
4.4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	78,07	90,60	90,60			90,60	Total de projeto de acordo com a reprogramação 02
								Total Item 4.4	90,60
					-60,40			-60,40	Desconto de total medido acumulado
4.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,88	370,00	300,00			300,00	De acordo com a evolução da obra
								Total Item 4.6	300,00
4.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	44,57	70,00	70,00			70,00	De acordo com a evolução da obra
								Total Item 4.7	70,00
4.8	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,4x0,4x0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	321,91	2,00	2,00			2,00	De acordo com a evolução da obra
								Total Item 4.8	2,00
4.9	Poste de aço conico contínuo curvo duplo, flangeado, h=7m, inclusive luminárias, sem lâmpadas - fornecimento e instalação, af 11/2019	UN	2.877,04	1,00	1,00			1,00	De acordo com a evolução da obra
								Total Item 4.9	1,00
4.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	761,71	2,00	2,00			2,00	De acordo com a evolução da obra
								Total Item 4.10	2,00
4.11	Banco de concreto pre-moldado com encosto	UN	1.052,17	2,00	2,00			2,00	De acordo com a evolução da obra
								Total Item 4.11	2,00

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.07.11 11:03:16 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO






JOAO BATISTA DA SILVA-92194982434

RONY MARCOS LOURENÇO MOREIRA 220421516

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ

VISÃO GERAL DA OBRA

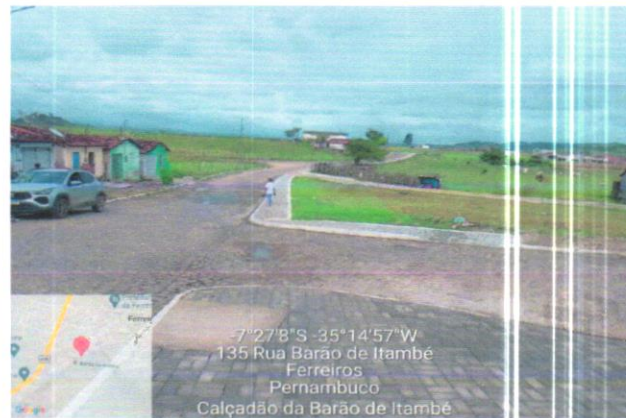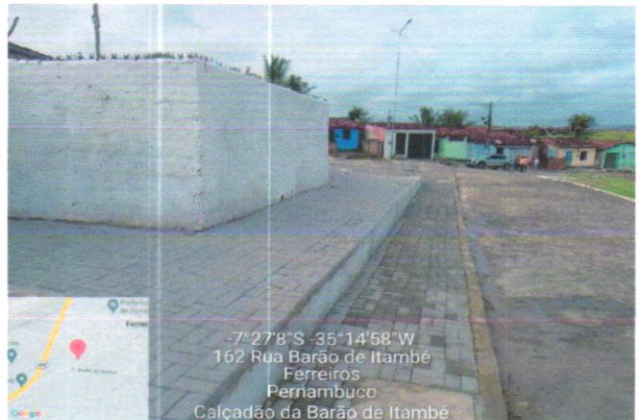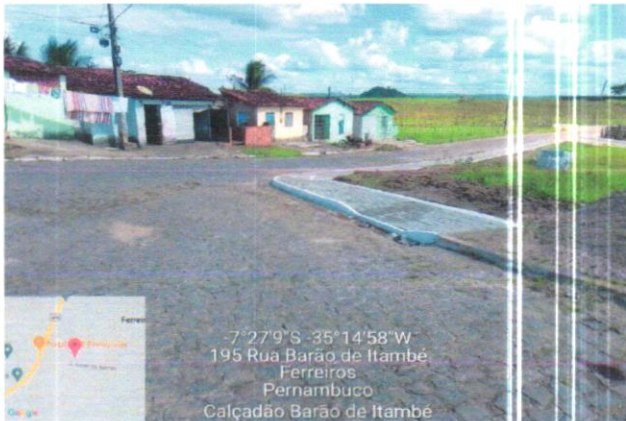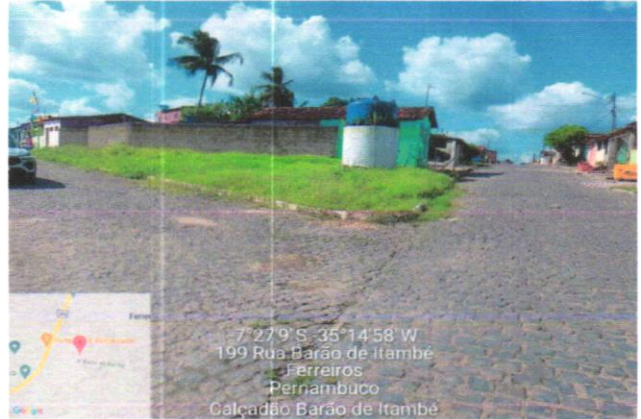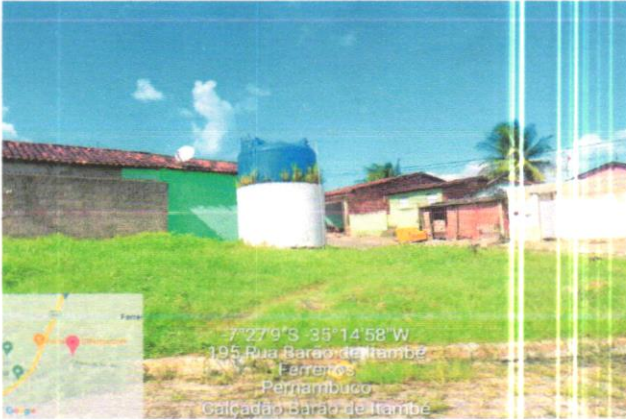

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:079630314 29

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.07.11 11:03:24 -03'00'





JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434
Dados: 2024.07.11 11:03:24 -03'00'

RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:0204215145 9

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:0204215145
Dados: 2024.07.11 11:43:00 -03'00'

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ

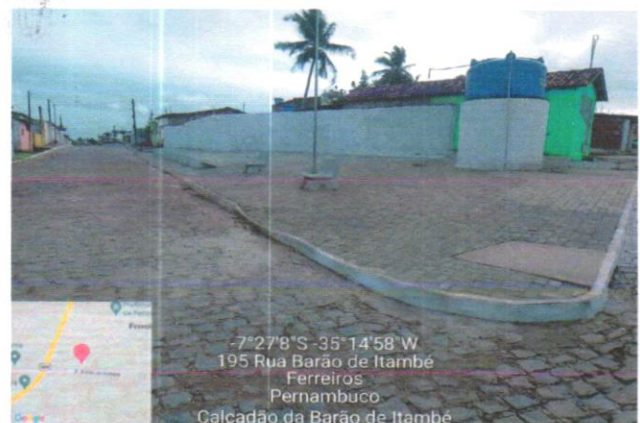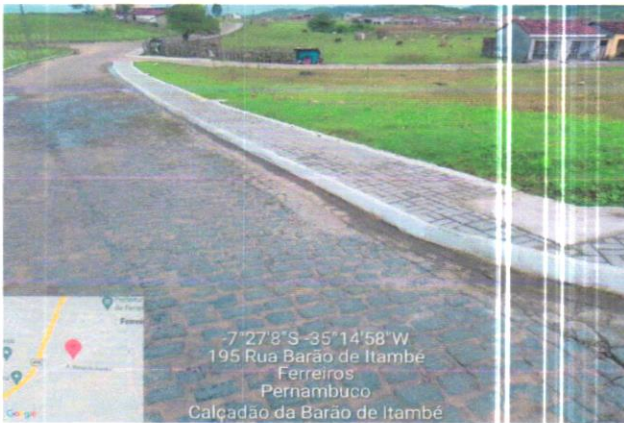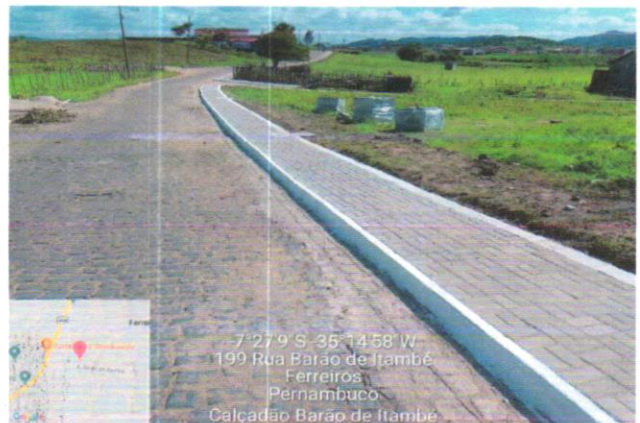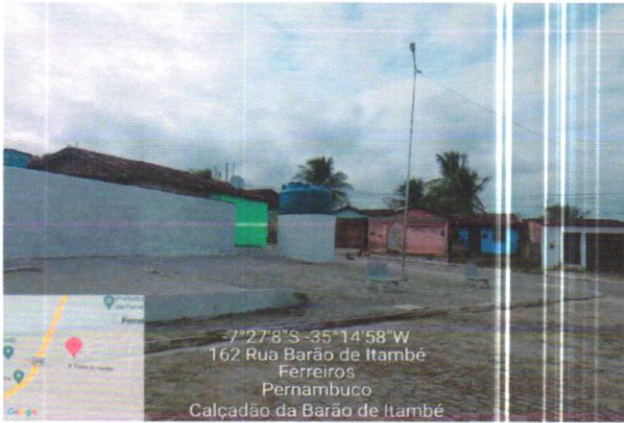

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA: 07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA: 07963031429
Data: 2024.07.11 11:03:35 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

JOAO BATISTA DA
SILVA: 92194982434

RONEY MARETO LOURENCO
MORADA: 024215168

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
