

BOLETIM DE MEDIÇÃO

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE	FERREIROS/PE	DATA MEDIÇÃO:	17/02/2025	VALOR DA MEDIÇÃO:	22.474,49
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO LOTEAMENTO FERREIRO NOVO, NAS PROXIMIDADES DA ANTIGA LAGOA DE ZÉ FELIX			CONTRATO R\$:	55.064,54
CONTRATO:	115/2024	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA 001/2024	PRAZOS DE EXEC.: 12/08/2024	11/10/2024
ADITIVO R\$:				0,00	
ORDEN DE SERVIÇOS:	12/08/2024	PRAZO EXECUÇÃO (DIAS):	60	ADITIVO EXECUÇÃO (DIAS):	180
C. ADITADO R\$:				55.064,54	
EMPRESA CONTRATADA:	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	PROPRIETÁRIO:	JORGE MOZART DE ALBUQUERQUE II	DATA FINAL:	09/04/2025
CNPJ:	32.507.681/0001-75	CPF:	009.882.564-22	P. RESTANTE DIAS:	51
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	NARK ANDRADE DE PAULA	CREA:	181.084.900-04	PE20241218685	SALDO R\$:
					32.590,05
GESTOR DE CONTRATO:	CESAR MARCELINO DA SILVA	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	12/08/2024	À	17/02/2025
FISCAL DE CONTRATO:	FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA	MATRÍCULA:	0543		
ENGENHEIRO FISCAL:	ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA	CREA/RPN:	160.666.136-1		
CNO:	90.021.29070/70	CREA/RPN:	160.991.108-3	PE20241228934	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						789,54	789,54	789,54	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	350,91	2,25	2,25	2,25	789,54	789,54	789,54	100,00%
2	DRENAGEM						54.275,00	21.684,95	21.684,95	
2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	124,56	200,00	94,00	94,00	24.912,00	11.708,64	11.708,64	47,00%
2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	958,50	15,00	5,00	5,00	14.377,50	4.792,50	4.792,50	33,33%
2.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	45,38	150,00	89,00	89,00	6.807,00	4.038,82	4.038,82	59,33%
2.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	163,57	50,00	7,00	7,00	8.178,50	1.144,99	1.144,99	14,00%
TOTAL							55.064,54	22.474,49	22.474,49	40,81%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.02.17 11:27:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat. 543



Documento assinado digitalmente
NARK ANDRADE DE PAULA
Data: 17/02/2025 13:50:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO LOTEAMENTO FERREIRO NOVO, NAS PROXIMIDADES DA ANTIGA LAGOA DE ZÉ FELIX

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDO NO PERÍODO			OBSERVAÇÕES
					COMPRIMENTO	LARGURA	TOTAL	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	350,81	2,25	1,50	1,50	2,25	Serviço finalizado
Total a medir item 1.1							2,25	
2 DRENAGEM								
2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	124,56	200,00	94,00		94,00	De acordo com a evolução da obra
Total a medir item 2.1							94,00	
2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	958,50	15,00	5,00		5,00	De acordo com a evolução da obra
Total a medir item 2.2							5,00	
2.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	45,38	150,00	89,00		89,00	De acordo com a evolução da obra
Total a medir item 2.3							89,00	
2.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	163,57	50,00	7,00		7,00	De acordo com a evolução da obra
Total a medir item 2.4							7,00	

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
07963031429
 Data: 2025.02.17 11:27:17 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

César Marcelino da Silva
 Secretário de Obras
 Mat. 543



Documento assinado digitalmente
MARK ANDRADE DE PAULA
 Data: 17/02/2025 13:50:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA
 RESPONSÁVEL EXECUÇÃO





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO LOTEAMENTO FERREIRO NOVO, NAS PROXIMIDADES DA ANTIGA LAGOA DE ZÉ FELIX

PLACA DE OBRAS



VISÃO GERAL DA OBRA

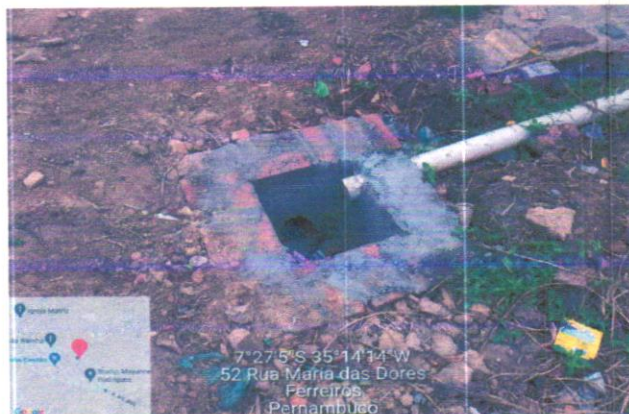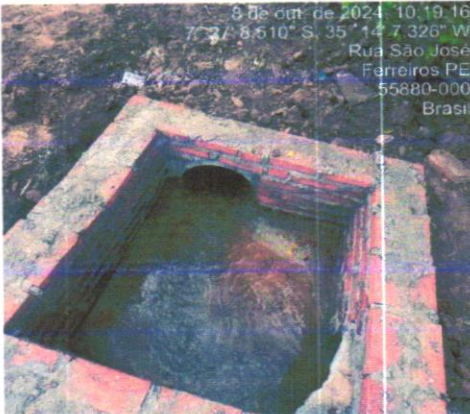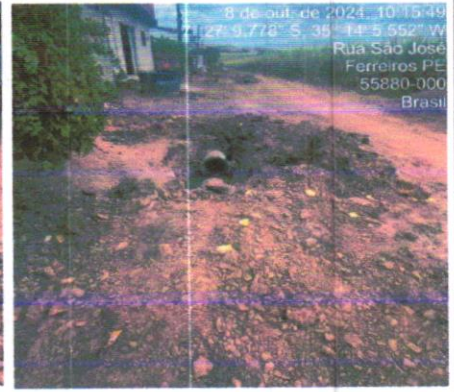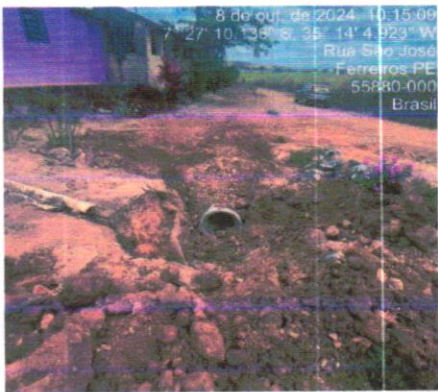






ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.02.17 11:27:26 -03'00'

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mst 543

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARK ANDRADE DE PAULA
Data: 17/02/2025 13:50:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS DO LOTEAMENTO FERREIRO NOVO, NAS PROXIMIDADES DA ANTIGA LAGOA DE ZÉ FELIX

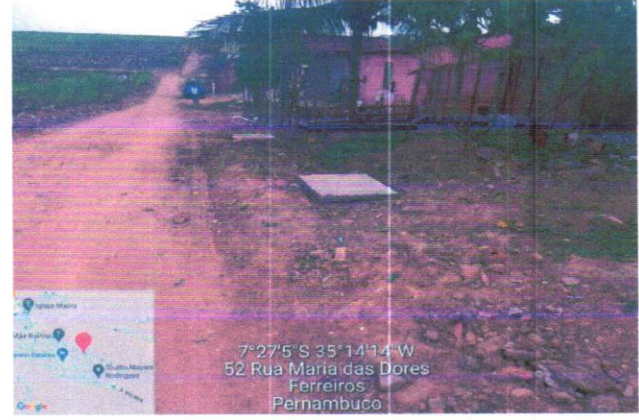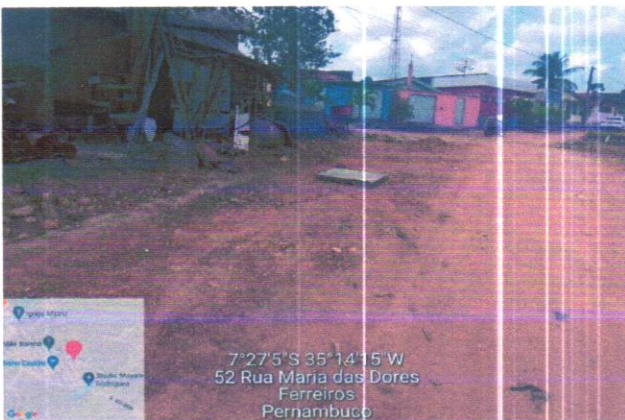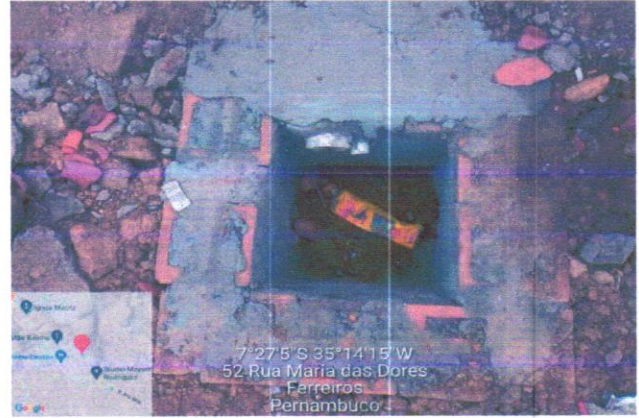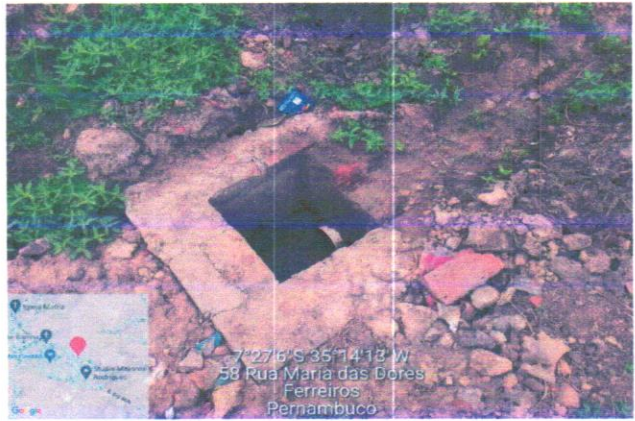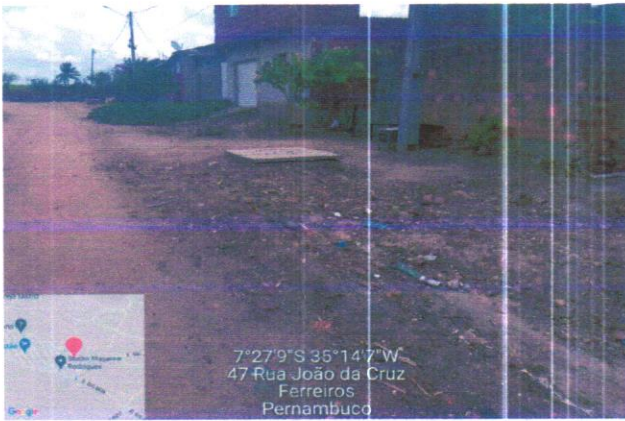

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429

Dados: 2025.02.17 11:27:55 -0300'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO

JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

César Marcelino da Silva Secretário de Obras Mat. 543

Documento assinado digitalmente MARK ANDRADE DE PAULA Data: 17/02/2025 13:50:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
