

BOLETIM DE MEDIÇÃO

001

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 03/06/2025

VALOR DA MEDIÇÃO: 28.397,19



OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FERREIROS/PE.

CONTRATO R\$: 28.899,87

CONTRATO: 019/2025 MODALIDADE: Dispensa 003/2025 PRAZOS DE EXEC.: 30/04/2025 30/06/2025

ADITIVO R\$:

ORDEM DE SERVIÇOS: 30/04/2025 PRAZO (DIAS): 60 dias ADITIVO (DIAS): - -

C. ADITADO R\$:

EMPRESA CONTRATADA: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA PROPRIETÁRIO: CLAUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA

DATA FINAL: 30/06/2025

CNPJ: 10.610.140/0001-35 CPF: 050.388.104-03

P. RESTANTE DIAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DAYARA RAYANNE DUARTE CAVALCANTE CREA: 1616016256 CREA-PE

SALDO R\$: 502,68

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS: 90.024.01373/74

GESTOR DE CONTRATO: ALEXA ARAUJO SOUSA DA SILVA
FISCAL DE CONTRATO: HELANIO DOS SANTOS ARAUJO VELOSO
ENGENHEIRO FISCAL: MARIA EDUARDA BERNARDO DE ANDRADE

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 A 30/05/2025
PORTARIA 002/2025
PORTARIA 026/2025
CREA/RPN: 1819121828 CREA-PE / 20241100502 ART

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
	Requalificação do Estacionamento da Secretária de Saúde									
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA	M²	551,31	2,25	2,25	2,25	1.240,44	1.240,44	1.240,44	100,00%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	136,63	24,00	24,00	24,00	3.279,12	3.279,12	3.279,12	100,00%
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,96	48,00	48,00	48,00	1.726,08	1.726,08	1.726,08	100,00%
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	64,72	8,90	8,90	8,90	576,00	576,00	576,00	100,00%
1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	232,51	10,29	10,29	10,29	2.392,52	2.392,52	2.392,52	100,00%
1.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	4,79	8,90	8,90	8,90	42,63	42,63	42,63	100,00%
1.7	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	10,79	30,50	30,50	30,50	329,09	329,09	329,09	100,00%
1.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	57,53	41,30	41,30	41,30	2.375,98	2.375,98	2.375,98	100,00%
1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M²	84,49	179,95	179,95	179,95	15.203,97	15.203,97	15.203,97	100,00%

Maria Eduarda B. de Andrade
Engenheira Civil
CREA-PE 1810121823

ASSINADO DIGITALMENTE
PRIME CONSTRUÇÕES LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sarp.pro.gov.br/assinador-digital>



Alexa Araújo Sousa da Silva
Secretária de Saúde
Portaria 002/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.10	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	60,52	11,33	11,33	11,33	685,69	685,69	685,69	100,00%
1.11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	5,87	67,00	67,00	67,00	393,29	393,29	393,29	100,00%
1.12	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M²	52,73	2,89	2,89	2,89	152,38	152,38	152,38	100,00%
1.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	10,07	24,96	0,00	0,00	251,34	0,00	0,00	0,00%
1.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	10,07	24,96	0,00	0,00	251,34	0,00	0,00	0,00%
TOTAL							28.899,87	28.397,19	28.397,19	98,26%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

Marino Eduardo B. de Almeida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Alexandro Sousa da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
Secretaria de Saúde
Portaria 007/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
PRIME CONSTRUCOES LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM

001

REQUALIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FERREIROS/PE.

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	
1	Requalificação do Estacionamento da Secretária de						
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	551,31	2,25	2,25		
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	136,63	24,00	24,00		
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,96	48,00	48,00		
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	64,72	8,90	8,90		
1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	232,51	10,29	10,29		
1.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	4,79	8,90	8,90		
1.7	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	10,79	30,50	30,50		
1.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE	M²	57,53	41,30	41,30		
1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	84,49	20,34	20,34		
1.10	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	60,52	11,33	11,33		
1.11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	5,87	67,00	67,00		
1.12	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	52,73	2,89	2,89		
1.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	UND	10,07	24,96	0,00		

ASSINADO DIGITALMENTE
PRIME CONSTRUCOES LTDAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital/>Aurea Araújo Sousa da Silva
Secretaria de Saúde
Data: 002/2025Maria Eduarda B. de Andrade Brito
Engenheira Civil
CREA PE 0110121023
RAB.

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM

001

REQUALIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FERREIROS/PE.

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	
1.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	UND	10,07	24,96	0,00		

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

Maria Eduarda B. de Azevedo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Alexandro Sousa da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE OBRAS

ASSINADO DIGITALMENTE
PRIME CONSTRUCOES LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>




RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Maria Eduarda B. de Azevedo
Engenheira Civil
CREA-PE 1310124823


Alexandro Sousa da Silva
Secretaria de Saúde
Portaria 0027/2025

REQUALIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FERREIROS/PE.
VISÃO GERAL DA OBRA

PLACA DE OBRA

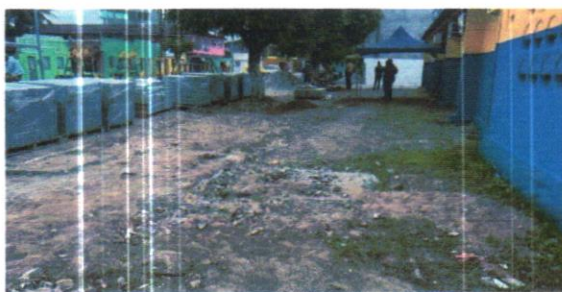



DEMOLIÇÃO

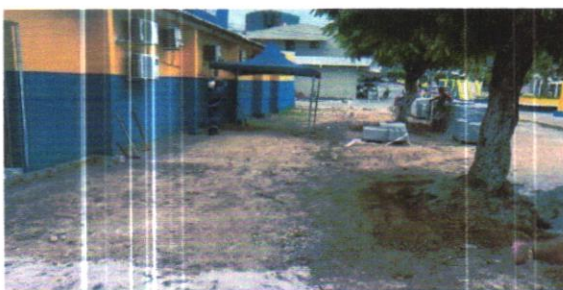

ASSENTAMENTO DE MEIO FIO



PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

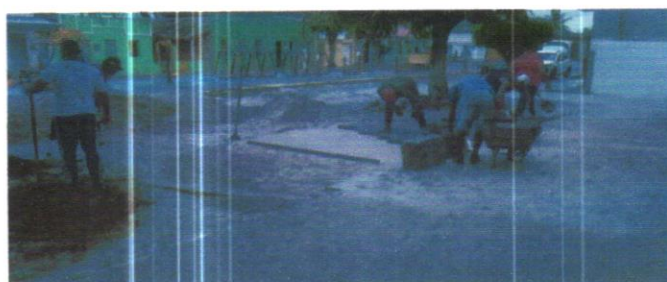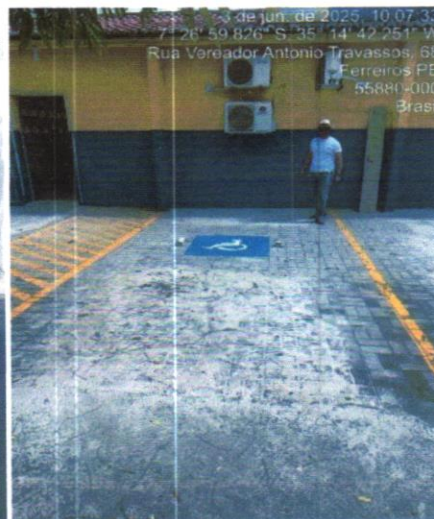

EXECUÇÃO DE PISO INTRETRAVADO

13/06/2025
Mário Eduardo da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE 131021223

ACIONADO DIGITALMENTE
PRIME CONSTRUÇÕES LTDA




A autenticidade e a assinatura podem ser verificadas em:
br:gov.br/assinador-digital



Alexa Araújo Sousa da Silva
Secretaria de Saúde
Portaria 002/2025


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQUALIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FERREIROS/PE.

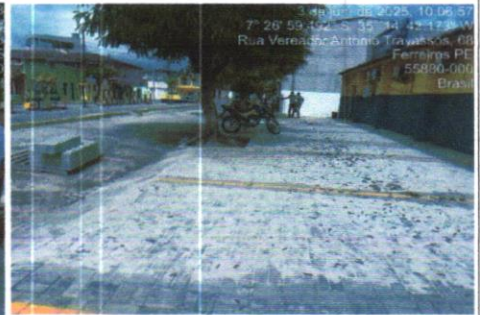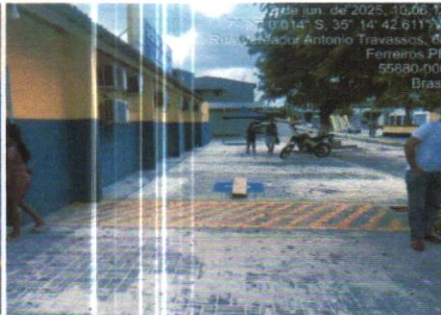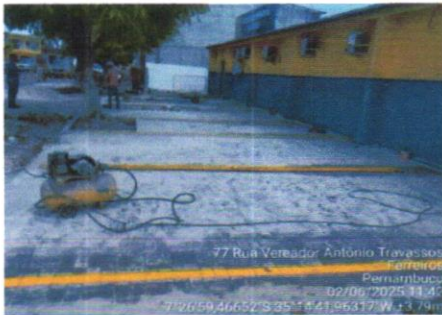

PINTURA DE DEMARCAÇÃO

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO
Alexa Araújo Sousa da Silva
Secretaria de Saúde
Portaria 002/2025

ASSINADO DIGITALMENTE:
PRIME CONSTRUCOES LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Maria Eduarda R. de Andrade Paes
Engenheira Civil
CREA-PE 1210121623
