

BOLETIM DE MEDIÇÃO

001

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROSIPE

DATA MEDIÇÃO: 20/08/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 87.785,05



FERREIROS
CIDADE DE ENCANOS - PE

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL PAULO VIANA DE QUEIROZ, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPREITEIRA

CONTRATO: 043/2022 MODALIDADE: DISPENSA 004/2022

PRAZOS DE EXEC.: 25/05/2022 25/08/2022

CONTRATO R\$: 87.785,05
ADITIVO R\$: 0,00
C. ADITADO R\$: 87.785,05

ORDEN DE SERVIÇOS: 25/05/2022 PRAZO (DIAS): 30

ADITIVO (DIAS):

DATA FINAL: 25/08/2022

EMPRESA CONTRATADA: E F DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI

PROPRIETÁRIO: ELIEZER FRUTUOSO DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ: 32.746.704/0001-02

CPF: 072.497.864-73

P. RESTANTE DIAS: 5
SALDO R\$: 0,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEGO CLAUDIO DA FONSECA LIMA

CPRE: 181.596.698-0 PE20220802711

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/05/2022 A 20/08/2022

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

MATRÍCULA: 608-4
CREAR/PPN: 160.666.138-1
CREAR/PPN: 160.991.108-3

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			VALOR PREVISTO	FINANCEIRO		
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL									
1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	862,94	1,00	1,00	1,00	862,94	862,94	100,00%	
1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	17,22	2,00	2,00	2,00	34,44	34,44	100,00%	
1.3	Quadro de medição trifásica com caixa em porfi	UN	859,74	1,00	1,00	1,00	859,74	859,74	100,00%	
1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	122,15	4,00	4,00	4,00	488,60	488,60	100,00%	
1.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	M	20,57	300,00	300,00	300,00	6.171,00	6.171,00	100,00%	
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE PARA FIXAÇÃO PARA 3 REFLETORES	UN	422,46	8,00	8,00	8,00	3.379,68	3.379,68	100,00%	
1.7	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 2000W EM POSTE DE ATE 23M	UN	636,65	20,00	20,00	20,00	12.713,00	12.713,00	100,00%	

ITALO HENRIQUE Assinado de forma digital

CAVALCANTE DE CAVALCANTE DE

ALMEIDA ALMEIDA 07963031429

07963031429

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4

Dados: 2022.06.20
0955009-033007

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.8	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE REATOR AFP EU (ACOPLADO) VAPOR METÁLICO DE 2000W, EM POSTE DE ATE 23M	UN	654,82	20,00	20,00	20,00	13.096,40	13.096,40	13.096,40	100,00%
1.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	11,23	75,00	75,00	75,00	842,25	842,25	842,25	100,00%
1.10	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 - FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO	M	49,29	500,00	500,00	500,00	24.645,00	24.645,00	24.645,00	100,00%
1.11	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 - FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO	M	34,37	400,00	400,00	400,00	13.748,00	13.748,00	13.748,00	100,00%
1.12	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,36	400,00	400,00	400,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00	100,00%
TOTAL							87.785,05	87.785,05	87.785,05	100,00%

É OBRIGATORIO O CARRIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.06.20 09:50:20 -03'00"

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.06.20 09:50:20 -03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claydionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 6084

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

E.F. DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

MEMORIAL DE CALCULO



BM 001

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL PAULO VIANA DE QUEIROZ, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPREITEIRA

RELATORIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
1.0	ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL						
1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	882,94	1,00	1,00	Vide projeto básico	Serviço concluído
1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	17,22	2,00	2,00	Vide projeto básico	
1.3	Quadro de medição trifásica com caixa em nobil	UN	859,74	1,00	1,00	Vide projeto básico	
1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	122,15	4,00	4,00	Vide projeto básico	
1.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD DN 63(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	20,57	300,00	300,00	Vide projeto básico	
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE PARA FIXAÇÃO PARA 3 REFLETORES FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 2000W EM POSTE DE ATE 23M	UN	422,46	8,00	8,00	Vide projeto básico	
1.7	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 2000W EM POSTE DE ATE 23M	UN	635,65	20,00	20,00	Vide projeto básico	
1.8	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE REATOR AFR EU (ACOPLADO) VAPOR METÁLICO DE 2000W, EM POSTE DE ATE 23M	UN	654,82	20,00	20,00	Vide projeto básico	
1.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	11,23	75,00	75,00	Vide projeto básico	
1.10	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	49,29	500,00	500,00	Vide projeto básico	
1.11	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,37	400,00	400,00	Vide projeto básico	
1.12	CABO DE COBRE PP CORDULAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,36	400,00	400,00	Vide projeto básico	

E OBRIGATORIO O CASINHO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
 Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
 Dado: 2022.08.20 09:50:32 -03'00'

Cláudio Manoel de Oliveira
 Sec. de Obras e Urbanismo
 Mat. 608




RESPOSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL PAULO VIANA DE QUEIROZ, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPREITEIRA

VISÃO GERAL DA OBRA

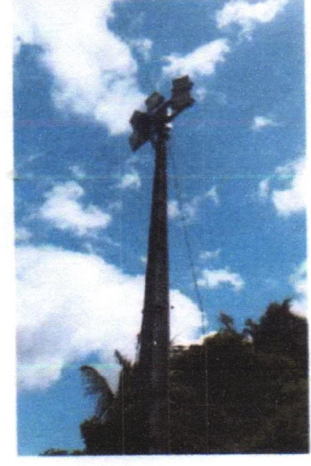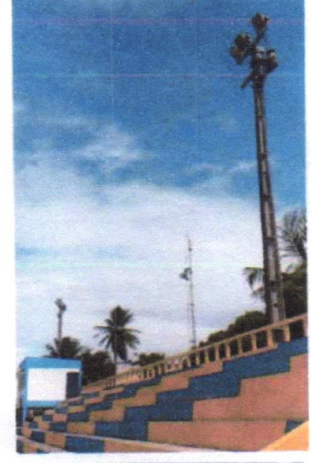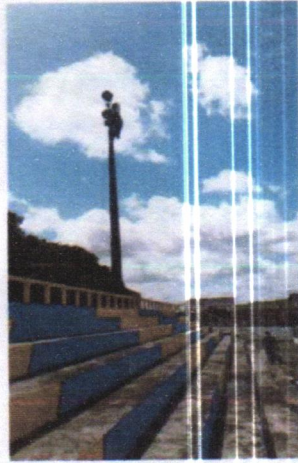

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo

Mat. 608-4

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429

Órgão: 2022.06.20 09:50:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

[Handwritten Signature]
E F DE OLIVEIRA JUNIOR LIREL
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
