

BOLETIM DE MEDIÇÃO

001

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 08/05/2023

VALOR DA MEDIÇÃO: 74.577,00

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO R\$: 434.057,60

CONTRATO: 069/PMF/2022

MODALIDADE: TP 004/2022

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEN DE SERVIÇOS: 18/04/2023

PRAZO (DIAS): 150

ADITIVO (DIAS): -

C. ADITADO R\$: 434.057,60



EMPRESA CONTRATADA: C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

PROPRIETÁRIO: CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

DATA FINAL: 15/09/2023

CNPJ: 17.331.335/0001-95

CPF: 023.498.134-28

P. RESTANTE DIAS: 130

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADRIANA NUNES DOS SANTOS

CREA: 181.894.289-5

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/04/2023

SALDO R\$: 359.480,60

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 608-4

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/04/2023

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA

CREAR/PPN: 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CREAR/PPN: 160.991.108-3

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	QUANTIDADE			VALOR PREVISTO	FINANCEIRO			
					MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)	
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.0	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26	M2	266,81	8,00	0,00	0,00	2.134,49	5.807,83	0,00	5.807,83	0,00%	
1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	M2	0,09	4.253,33	736,04	736,04	382,79	66,24	66,24	66,24	17,30%	
1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO S DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M2	10,00	1.276,00	220,81	220,81	12.760,00	2.208,10	2.208,10	2.208,10	17,30%	
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF 02/2016	M2	800,01	12,00	2,00	2,00	9.600,12	1.600,02	1.600,02	1.600,02	16,67%	
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,59	200,00	33,00	33,00	11.718,00	1.933,47	1.933,47	1.933,47	16,50%	
1.5	PAVIMENTAÇÃO						397.462,20	68.769,17	68.769,17	68.769,17		
2.0	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	51,49	1.442,06	249,32	249,32	74.251,66	12.837,49	12.837,49	12.837,49	17,29%	
2.1												

(Assinatura)

Henrique Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA RN 160 991 103

(Assinatura)

Claudsonor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4

(Assinatura)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			VALOR PREVISTO	FINANCEIRO		
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	75,99	4.253,33	736,04	736,04	323.210,54	55.931,68	55.931,68	17,31%
TOTAL							434.057,60	74.577,00	74.577,00	17,18%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

Italo H C Almeida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Cláudio Manoel de Oliveira
 Sec. de Obras e Urbanismo
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

C&M CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Italo Henrique Calabante
 Engenheiro Civil
 CREA RN 160.991-10

MEMORIAL DE CÁLCULO

BM 001



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARÁ SEDE DESTA MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	M2	0,08	4.253,33	736,04	736,04	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M2	10,00	1.276,00	220,81	220,81	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF 02/2016	M2	800,01	12,00	2,00	2,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov
1.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,59	200,00	33,00	33,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov
2.0	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	51,49	1.442,06	249,32	249,32	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	M2	75,99	4.253,33	736,04	736,04	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

IBLH CA Almeida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO





Carla Maria Mangel de Oliveira
 Sec. de Obras e Urbanismo
 Max. 608-4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

[Assinatura]
 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Yalvo Henrique Cavalcante
 Engenheiro Civil
 CREA RN 19009911-1

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARÁ SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

VISÃO GERAL DA OBRA

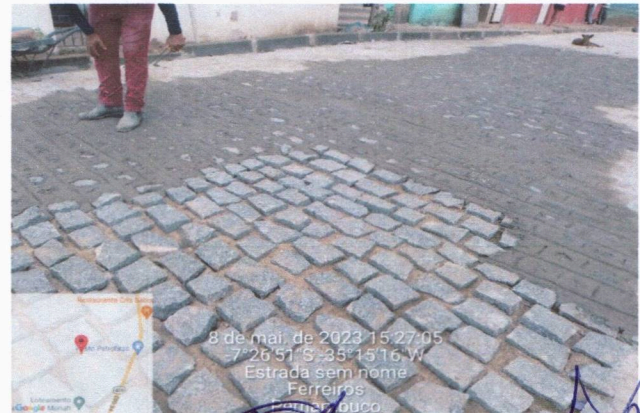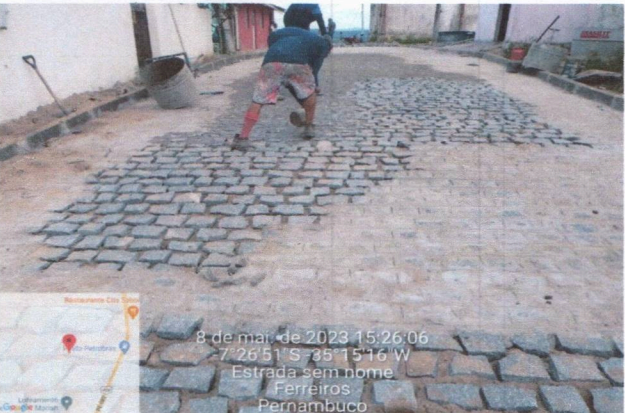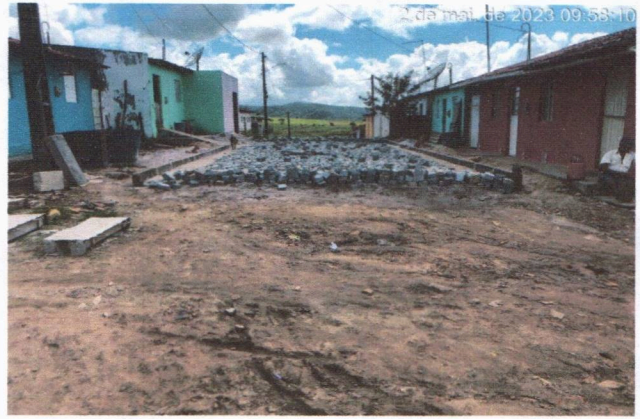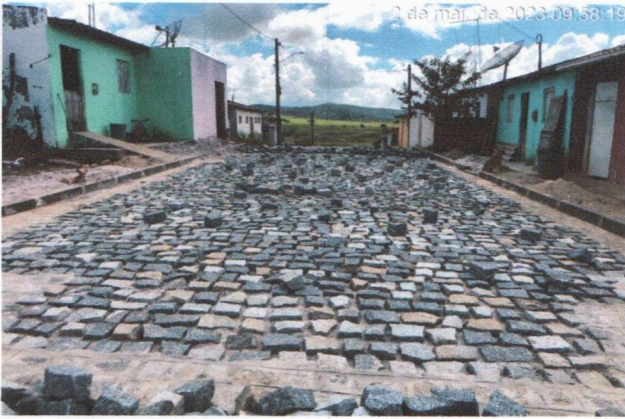

Henrique Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA RN 160 991 107

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARÁ SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE



É OBRIGATORIO O CARIMBO.

Italo H C Almeida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudionor Manoel de Oliveira
 Sec. de Obras e Urbanismo
 Nº 608-4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

[Signature]
 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Italo Henrique Cavalcante de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA RN 160 991 108-7
